

KARTOTINIS PROJEKTAS „VĖSPERĖ“ 80 M²



53 000 €



A+ KLASĖ

ENERGIŠKAI EFEKTYVUS
SKYDINIS KARKASINIS NAMAS



SKYDNAMIS.LT

ŠIAURINIS FASADAS



VAKARINIS FASADAS




PIETINIS FASADAS




RYTINIS FASADAS



IŠDĖSTYMAS SKLYPE

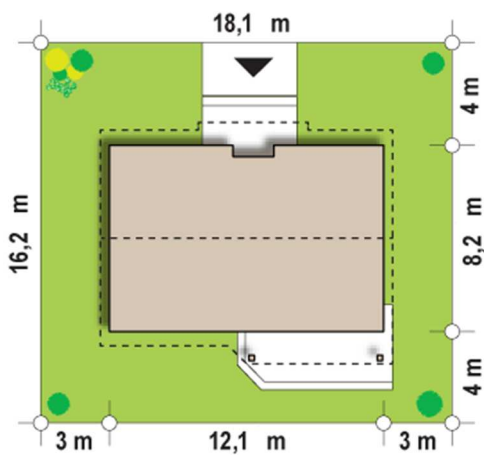

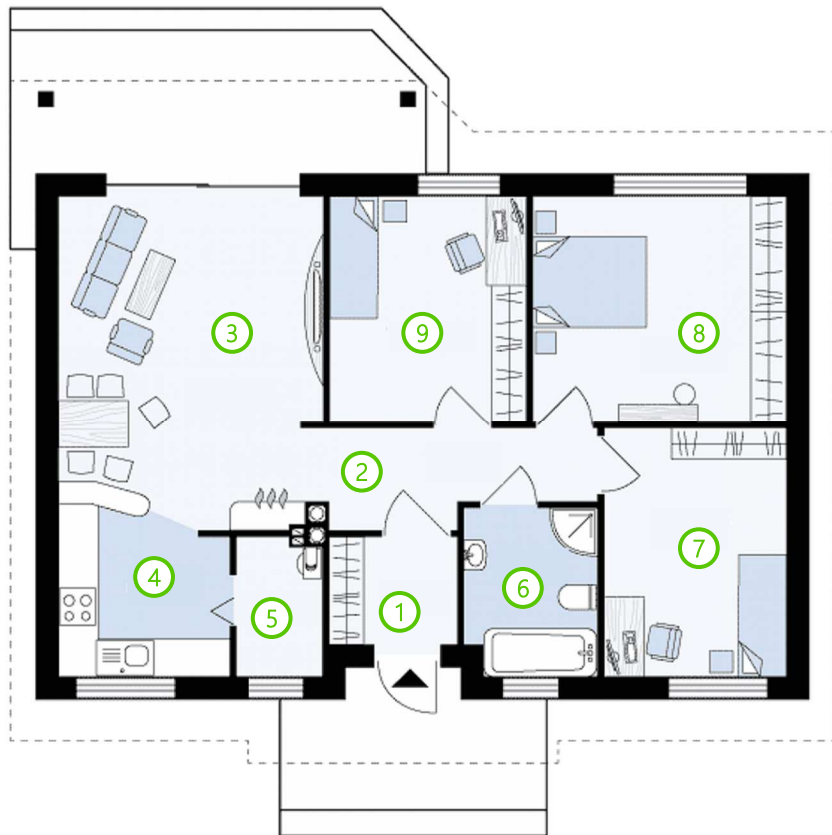

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS, M ²
1	Prieškambaris	3.30
2	Koridorius	5.40
3	Svetainė	21.5
4	Virtuvė	6.40
5	Katilinė	2.70
6	Vonios kambarys	5.20
7	Vaiko kambarys	11.0
8	Tėvų kambarys	14.0
9	Vaiko kambarys	10.5
Viso:		80.0

PAMATAI IR GRINDYS ANT GRUNTO

Poz.	PAVADINIMAS	DARBAS	MEDŽIAG.	MECHAN.	
POLINIAI PAMATAI		UŽSTAT., M ² :	99,3	PERIMET.,M:	41,6
1	Ploto planiravimas nuimant juodžemį	+	+	+	
2	Ašių nužymėjimas	+	+	+	
3	Gręžtiniai gelžbetoniniai poliai	+	+	+	
4	Sutankintas pagrindas iš smėlio-žvyro	+	+	+	
5	Rostverkas iš ICF liktinių klojinių	+	+	+	
GRINDYS ANT GRUNTO		PLOTAS, M ²	83,3	PERIMET.,M:	38,8
1	Smėlio pagrindas grindims, 150mm	+	+	+	
2	Šilumos izoliacija, EPS80N, 350mm	+	+	+	
3	Skiriam. sluoksnis, PE plėvelė, 0,2mm	+	+	+	
4	Armavimas tinklu 4/4/150/150mm	+	+	+	
5	Fibrobetoninės grindys, 60mm	+	+	+	

NAMO STATYBA

Poz.	PAVADINIMAS	DARBAS	MEDŽIAG.	MECHAN.	
IŠORINĖS SIENOS		PLOTAS, M ² :	125	ANGOS, M ² :	21,6
1	Medinis karkasas, 45x195mm	+	+	+	
2	Sienų plokštė, OSB 12mm	+	+	+	
3	Šilumos izoliacija, min.vata, 200mm	+	+	+	
4	Garų izoliacija, PE plėvelė, 0.2mm	+	+	+	
5	Medinis skersinis karkasas, 45x45mm	+	+	+	
6	Gipso kartonas, 2x12.5mm	+	+	+	
LANGAI IR DURYS IŠORINĖSE SIENOSE		LANGAI, M ² :	19,4	DURYS, VNT	1
1	Plastikiniai langai, Rehau Geneo	+	+	+	
2	Plastikinės įėjimo durys, Rehau Geneo	+	+	+	
3	Angų izoliavimas montavimo putomis	+	+	+	
4	Langų sandarinimas, vid. ir išor.	+	+	+	
IŠORĖS APDAILA STRUKTŪRINIŲ TINKŲ		PLOTAS, M ² :	135	ANGOS, M:	50,9
1	PVC cokolio profilis	+	+	+	
2	Šilumos izoliacija, EPS70, 100mm	+	+	+	
3	Angokraščių šiltinimas, EPS70, 20mm	+	+	+	
4	EPS dekoratyviniai langų apvadai	-	-	-	
5	Kampų ir angokraščių armavimas	+	+	+	
6	Tinkavimas armuojant tinkleliu	+	+	+	
7	Paviršiaus gruntavimas	+	+	+	
8	Dekoratyvinis tinkavimas tinku	+	+	+	
9	Angokraščių dekor. tinkavimas tinku	+	+	+	
10	Palangių iš skardos montavimas	+	+	+	
SIENŲ APDAILA DAILYLENTĖMIS		PLOTAS, M ² :	53		
1	Medinis karkasas, 28x45mm	-	-	-	
2	Dažytos medinės dailylentės, 22mm	-	-	-	

Poz.	PAVADINIMAS	DARBAS MEDŽIAG. MECHAN.			
VIDINĖS SIENOS		PLOTAS, M ² :	91	PERIMET., M:	31
1	Dviejų sluoksnių GKP pertvaros, 150mm	+	+	+	
LUBOS		PLOTAS, M ² :	96		
1	Šilumos izoliacija, biri min.vata, 500mm	+	+	+	
2	Garų izoliacija, PE plėvelė, 0.2mm	+	+	+	
3	Pagrindas šilumos izoliacijai, OSB 15mm	+	+	+	
4	Lubų metalinis karkasas	+	+	+	
5	Gipso kartonas, 1x12.5mm				
STOGAS		STOGAS, M ² :	145	PAKALIM, M ² :	35
1	Medinių santvarų gamyba, 11 vnt.	+	+	+	
2	Santvarų montavimas, ž=1200mm	+	+	+	
3	Klijuotos sijos ir kolonos	+	+	+	
4	Priegeginių įrengimas	+	+	+	
5	Antikondensacinė plėvelė	+	+	+	
6	Prispaudžiantysis tašas, 28x45mm	+	+	+	
7	Grebėstas, 32x100mm, ž=350mm	+	+	+	
8	Stogo danga, Ruukki Monterrey FEB40	+	+	+	
9	Laštakiai iš skardos	+	+	+	
10	Kraigas iš skardos	+	+	+	
11	Vėjalentės iš skardos	+	+	+	
12	Plieniniai latakai	+	+	+	
13	Plieniniai lietvamzdžiai	+	+	+	
14	Pakalimas dažyt. dailylentėmis, 22mm	+	+	+	
SANDARINIMAS					
1	Sandarinimas iš vidaus	+	+	+	
2	Sandarinimas iš išorės	+	+	+	
3	Sandarumo testas	-	-	-	

PASTABOS

- 1 Medžiagų ir konstrukcijų transportavimas neįskaičiuotas;
- 2 Sunkiosios technikos darbas (betono siurblys, ekskavatorius, gręžimo mašina, kranas) neįskaičiuota;
- 3 Šiukšlių išvežimas neįskaičiuotas;
- 4 Projektas ir statybos leidimo gavimas neįskaičiuota;
- 5 Projektas ir sąmata gali būti koreguojami pagal užsakovo poreikius.

KAINA: išvardintų darbų kaina - 53 000Eur.

REZULTATAS: A+ klasės namas su pamatais, pilna lauko apdaila ir daline vidaus apdaila.

Į KAINĄ NEĮSKAIČIUOTA:

1. lauko ir vidaus inžineriniai tinklai (elektra, santechnika, šildymas, vėdinimas ir kt.);
2. galutinė vidaus apdaila.

TERMINAS: pasiūlyme išvardintus darbus galime atlikti per 3-4 mėnesius.

UŽSAKOVUI PAGEIDAUJANT:

1. pasirūpinsime statybos leidimu;
2. atliksime vidaus inžinerinių tinklų įrengimo darbus;
3. atliksime galutinius vidaus apdailos darbus;
4. galima keisti išorės apdailą, keisit vidaus išplanavimą, langų išdėstymą.

PRIVALUMAI:

1. visus darbus gausite iš vieno rankų;
2. naudojant medines santvaras nereikia vidinių laikinųjų sienų, todėl yra galimybė laisvai keisti vidaus patalpų išplanavimą.



TURITE KLAUSIMŲ?

Susisiekite su mumis:


El.paštu skydnamis@gmail.com

Telefonu +370 65953501

A+ KLASĖ

GRINDŲ ANT GRUNTO PJŪVIO SUDĖTIS


1. Grindų danga
2. Armuotas betonas, 60mm
3. Škiriamasis sluoksnis, 0.2mm
4. Šilumos izoliacija, EPS80N, 350mm,
6. Sutankintas smėlis
7. Sutankintas smėlis-žvyras
8. Natūralus gruntas

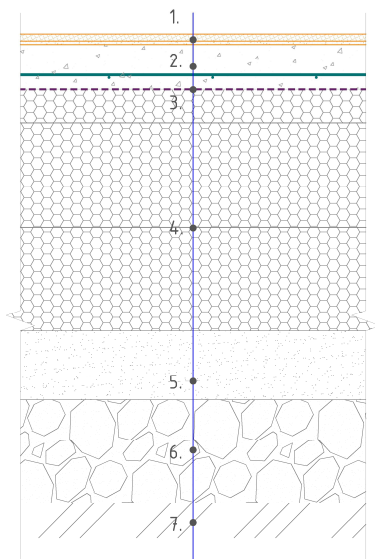

A+ KLASĖ

SIENOS PJŪVIO SUDĖTIS


1. Gipso kartono plokštė, 2x12.5mm
2. Vertikalus tašas, 45x45mm
3. Garų izoliacija, PE plėvelė, 0.2mm
4. Medinis karkasas, 195mm
5. Šilumos izoliacija, min. vata, 200mm,
6. Štandumo plokštė, OSB-3, 12mm
7. Šilumos izoliacija, EPS70, 100mm
8. Struktūrinis tinkas

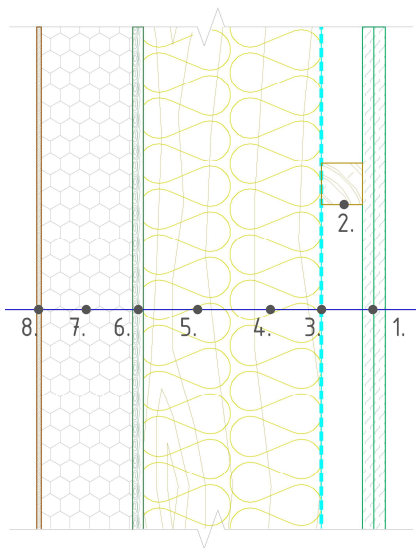

A+ KLASĖ

PERDANGOS PJŪVIO SUDĖTIS

1. Gipso kartono plokštė, 12.5mm
2. Metalinis lubų karkasas
3. Pagrindas biriai vatai, OSB 15mm
4. Garų izoliacija, PE plėvelė, 0.2mm
5. Štogo konstrukcija
6. Šilumos izoliacija, biri min. vata, 500mm

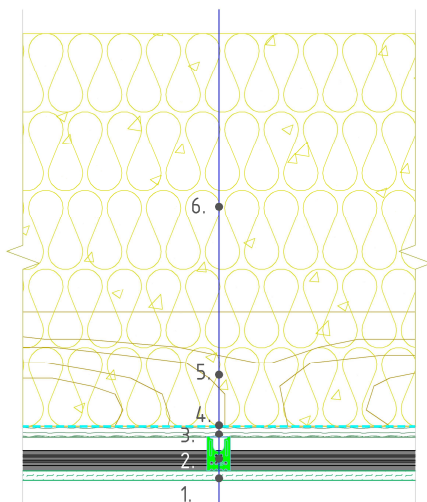



SKYDNAMIS.LT

SKYDINIAI KARKASINIAI NAMAI

PROJEKTAVIMAS - GAMYBA - STATYBA

MŪSŲ KONTAKTAI

UAB „WOOD & HOUSES“
Kalvarijų g. 124, 101 kab.
skydnamis@gmail.com
www.skydnamis.lt
+37065953501

VESPERE (...IR KITUS DARBUS) RASITE FACEBOOK'Ė

UAB "WOOD & HOUSES" SKYDINIAI NAMAI



@Info.SkydiniaiKarkasiniaiNamai

