


KOMERCINIS PASIŪLYMAS NR. WH80.1

SKYDINIS KARKASINIS SODO NAMO PUSGAMINĖ DĖŽUTĖ

OBJEKTAS

PAV.: SODO NAMAS, 72,8 KV.M., B KLASĖ, PUSGAMINĖ DĖŽUTĖ

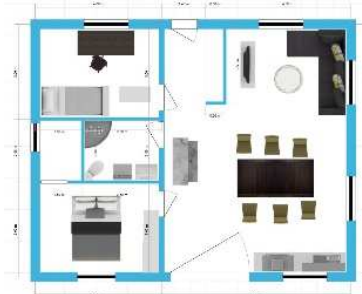

PAVADINIMAS	VNT.	KIEKIS	DARBAS	MEDŽIAG.	MECHAN.
POLINIAI PAMATAI		UŽSTAT., M2:	85,5	PERIMETR., M:	37,2
1 Ploto planiravimas nuimant juodžemį	M2	119,7	96,00	35,91	3,83
2 Ašių nužymėjimas	M2	85,5	128,25	61,13	12,48
3 Gręžtiniai gelžbetoniniai poliai, D300	M3	2,6	311,88	362,85	26,28
4 Sutankintas pagrindas iš smėlio	M3	21,4	214,18	210,54	28,39
5 Apšiltintas GB rostverkas iš EPS blokų	M2	18,6	348,75	1246,20	37,39
6 Murloto hidroizoliacija HDPE	M	37,2	35,60	20,27	0,37
7 Sandarinimo tarpinė iš pūsto PE	M	37,2	35,60	20,27	0,37
IŠORINĖS SIENOS		SIENOS, M2:	100,4	PERIMET, M:	37,2
1 Medinis karkasas, 45x145mm, C24	M3	2,5	676,25	927,31	22,34
2 Išorinių sienų skydų montavimas	M2	100,4	401,76	150,66	27,72
ŠLAITINIS STOGAS		STOGAS, M2:	115,0	PAKALIM., M2:	29,70
1 Stogo santvaros, ž=1.2m	M2	97,8	9,78	978,00	9,78
2 Stogo santvarų montavimas, ž=1.2m	M2	97,8	391,20	39,12	9,78

PASTABOS:

- 1 Žemės darbų apimtys tikslinamos pagal faktines sąnaudas;
- 2 Automobilinio krano darbas neįskaičiuotas;
- 3 Konstrukcijų ir medžiagų transportavimas neįskaičiuotas;
- 4 Kaina koreguojama parengus techninį darbo projektą;
- 6 Technikos darbas (eskavatorius, gręžimo mašina, savivartis, betono siurblys ir kt.) neįskaičiuotas.
- 7 Pasiūlyme kaina paskaičiuota vykdant darbus pagal verslo liudijimą (darbas be PVM, medžiagos su PVM)
- 8 Žymenų reikšmė: "+" į kainą įtraukta; "-" į kainą neįtraukta
- 9 Darbams suteikiamos garantijos

IŠ VISO KAINA, EUR: 7770,00

1KV.M. KAINA, EUR: 110,00
