
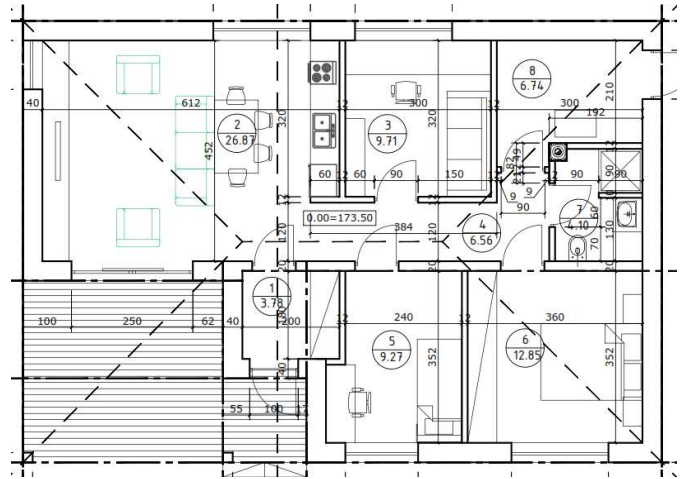


KOMERCINIS PASIŪLYMAS NR. WH 80.3

SKYDINIO KARKASINIO NAMO PUSGAMINĖ DĖŽUTĖ

OBJEKTAS

PAV.: GYVENAMASIS NAMAS, 80KV.M., PUSGAMINĖ DĖŽUTĖ

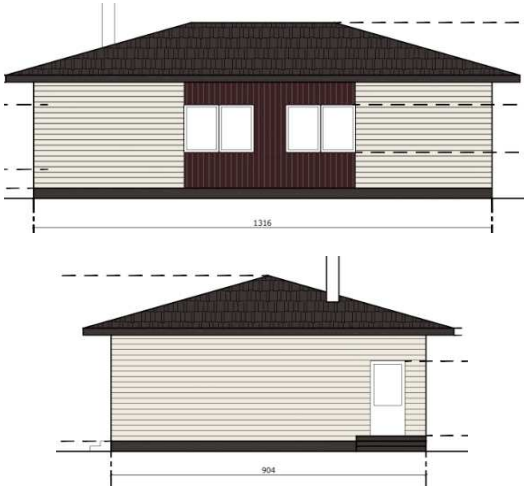

POZ.	PAVADINIMAS	VNT	KIEKIS	DARBAS	MEDŽIAG.	MECHAN.
POLINIAI PAMATAI			UŽSTAT., M2:	120	PERIMETR., M:	44,5
1	Ploto planiravimas nuimant juodžemį	M2	168,0	+	+	+
2	Ašių nužymėjimas	M2	120,0	+	+	+
3	Gręžtiniai gelžbetoniniai poliai, D300	M3	3,1	+	+	+
4	Sutankintas pagrindas iš smėlio	M3	11,13	+	+	+
5	Apšiltintas GB rostverkas iš EPS blokų	M2	22,25	+	+	+
6	Pamato hidroizoliacija HDPE	M	44,50	+	+	+
7	Sandarinimo tarpinė iš pūsto PE	M	44,50	+	+	+
IŠORINĖS SIENOS			SIENOS, M2:	133,5	ANGOS, M2:	23
1	Medinis karkasas, 45x195mm	M3	3,67	+	+	+
2	Išorinių sienų skydų montavimas	M2	133,5	+	+	+
STOGO KONSTRUKCIJOS			STOGAS, M2:	160		
1	Medinių santvarų gamyba	M2	160,00	+	+	+
2	Medinių santvarų montavimas	M2	160,00	+	+	+
3	Klijuotos medienos sijos ir kolonos	VNT	4,0	+	+	+

PASTABOS:

- Žemės darbų apimtys tikslinamos pagal faktines sąnaudas;
- Automobilinio krano darbas neįskaičiuotas;
- Konstrukcijų ir medžiagų transportavimas neįskaičiuotas;
- Kaina koreguojama parengus techninį darbo projektą;
- Technikos darbas (eskavatorius, gręžimo mašina, savivartis, betono siurblys ir kt.) neįskaičiuotas.
- Pasiūlyme kaina paskaičiuota vykdant darbus pagal verslo liudijimą (darbas be PVM, medžiagos su PVM)
- Žymenų reikšmė: "+" į kainą įtraukta; "-" į kainą neįtraukta
- Darbams suteikiamos garantijos

IŠ VISO KAINA, EUR: 14740,00
1KV.M. KAINA, EUR: 180,00
