
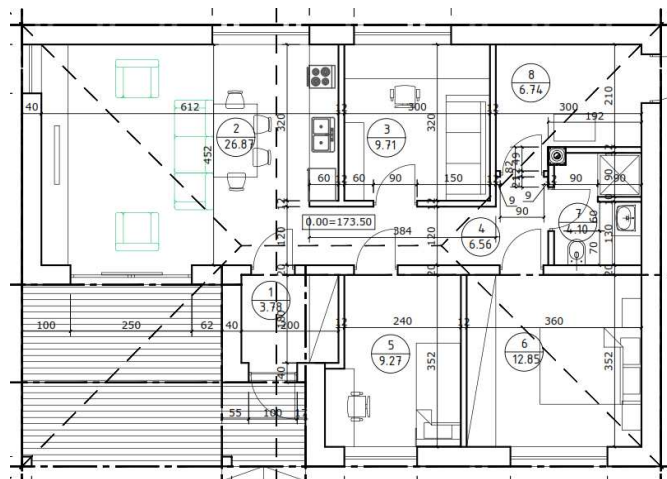


KOMERCINIS PASIŪLYMAS NR. WH 80.3

SKYDINIS KARKASINIS NAMAS SU IŠORĖS APDAILA

OBJEKTAS

PAV.: GYVENAMASIS NAMAS SU IŠORĖS APDAILA, 80KV.M., A+ KLASĖ

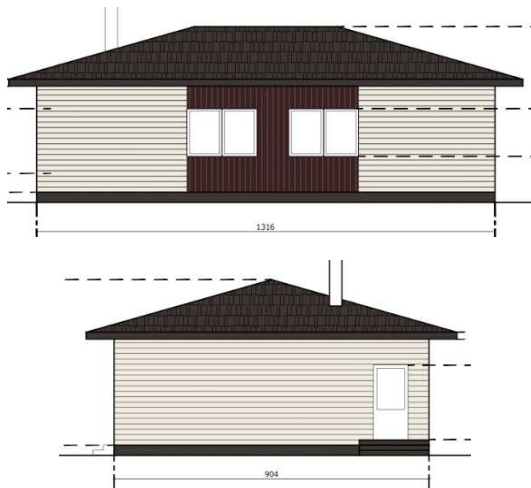

POZ.	PAVADINIMAS	VNT	KIEKIS	DARBAS	MEDŽIAG.	MECHAN.
POLINIAI PAMATAI			UŽSTAT., M2:	120	PERIMETR., M:	44,5
1	Ploto planiravimas nuimant juodžemį	M2	168,0	+	+	+
2	Ašių nužymėjimas	M2	120,0	+	+	+
3	Gręžtiniai gelžbetoniniai poliai, D300	M3	3,1	+	+	+
4	Sutankintas pagrindas iš smėlio	M3	11,13	+	+	+
5	Apšiltintas GB rostverkas iš EPS bloky	M2	22,25	+	+	+
6	Pamato hidroizoliacija HDPE	M	44,50	+	+	+
7	Sandarinimo tarpinė iš pūsto PE	M	44,50	+	+	+
IŠORINĖS SIENOS			SIENOS, M2:	133,5	ANGOS, M2:	23
1	Medinis karkasas, 45x195mm	M3	3,67	+	+	+
2	Sienų plokštė, Durelis TG4, 12mm	M2	110,5	+	+	+
3	Išorinių sienų skydų montavimas	M2	133,5	+	+	+
STOGO KONSTRUKCIJOS			STOGAS, M2:	160		
1	Medinių santvarų gamyba	M2	160,00	+	+	+
2	Medinių santvarų montavimas	M2	160,00	+	+	+
3	Klijuotos medienos sijos ir kolonos	VNT	4,0	+	+	+
ŠLAITINIO STOGO DANGA			STOGAS, M2:	160,00	PAKALIM., M2:	71
1	Antikondensacinė plėvelė	M2	160,00	+	+	+
2	Ventiliacinis tašas, 45x45mm	M	184,00	+	+	+
3	Grebėstas, 32x100mm, cc=300mm	M	536,00	+	+	+
4	Plieninė stogo danga, Ruukki Classic	M2	160,00	+	+	+
5	Pakalimas dažyt.dailylentėmis, 20mm	M2	71,00	+	+	+
6	Laštakis iš skardos	M	50,00	+	+	+
7	Kraigas iš skardos	M	36,20	+	+	+
8	Plieniniai latakai	M	50,00	+	+	+
9	Plieniniai lietvamzdžiai	M	12,00	+	+	+

IŠORĖS APDAILA STRUKTŪRINIŲ TINKŲ		PLOTAS, M2:	128	ANGOS, M':	54
1	PVC cokolio profilis	M	45,00	+	+
2	Šiltinimas klijuojant min.vatą, 100mm	M2	128,00	+	+
3	Vidinių ir išorinių kampų armavimas	M	82,00	+	+
4	Angokraščių armavimas PVC profiliu	M	54,00	+	+
5	Dvisluok.tinkavimas armuojant tinkleli	M2	128,00	+	+
6	Paviršiaus gruntavimas	M2	136,10	+	+
7	Dekoratyv.tinkavimas akriliniu tinku	M2	136,10	+	+

LANGAI IR DURYS IŠORINĖSE SIENOSE		ANGOS, M2:	22	PERIMETR.,M:	54
1	PVC langai ir durys, Rehau Synego	M2	22,0	+	+
2	Angų izoliavimas montavimo putomis	M	49,50	+	+
3	Langų sandarinimas vid. ir išor.	M	108,00	+	+

PASTABOS:

- 1 Žemės darbų apimtys tikslinamos pagal faktines sąnaudas;
- 2 Automobilinio krano darbas neįskaičiuotas;
- 3 Konstrukcijų ir medžiagų transportavimas neįskaičiuotas;
- 4 Kaina koreguojama parengus techninį darbo projektą;
- 6 Technikos darbas (eskavatorius, gręžimo mašina, savivartis, betono siurblys ir kt.) neįskaičiuotas.
- 7 Pasiūlyme kaina paskaičiuota vykdant darbus pagal verslo liudijimą (darbas be PVM, medžiagos su PVM)
- 8 Žymenų reikšmė: "+" į kainą įtraukta; "-" į kainą neįtraukta
- 9 Darbams suteikiamos garantijos

IŠ VISO KAINA, EUR: 35950,00

1KV.M. KAINA, EUR: 450,00
