


KOMERCINIS PASIŪLYMAS NR. WH 80.4

SODO NAMO PUSGAMINĖ DĖŽUTĖ

OBJEKTAS

PAV.: SODO NAMO PUSGAMINĖ DĖŽUTĖ, 60 KV.M., VIDUJE AUKŠTOS LUBOS

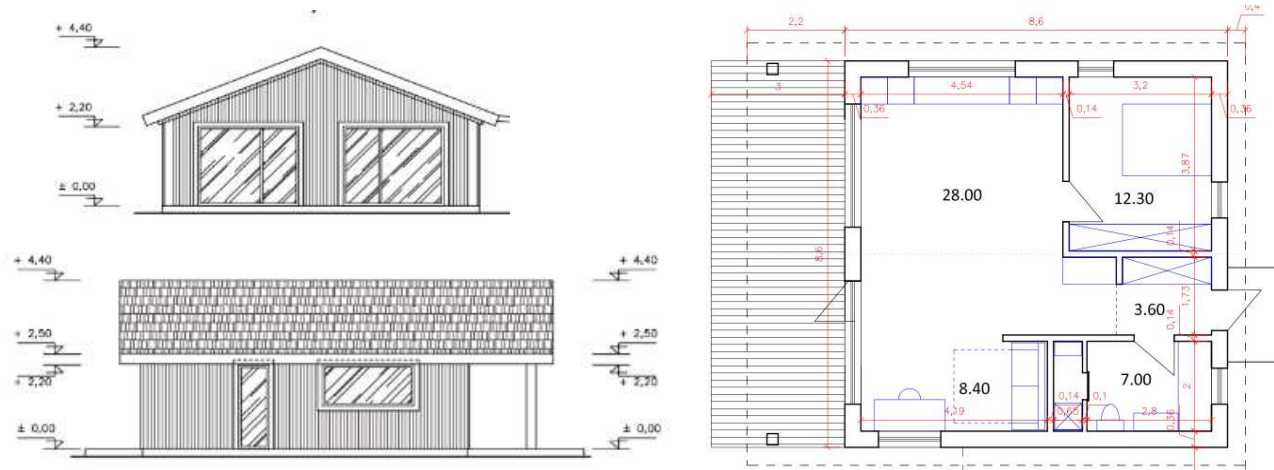

PAVADINIMAS	VNT.	KIEKIS	DARBAS	MEDŽIAG.	MECHAN.
POLINIAI PAMATAI		UŽSTAT., M2:	74,5	PERIMETR.,M:	34,5
1 Ploto planiravimas nuimant juodžemį	M2	104,3	+	+	+
2 Ašių nužymėjimas	M2	74,5	+	+	+
3 Gręžtiniai gelžbetoniniai poliai, D300	M3	2,1	+	+	+
4 Sutankintas pagrindas iš smėlio	M3	8,6	+	+	+
5 Apšiltintas GB rostverkas iš EPS bloky	M2	17,3	+	+	+
6 Murloto hidroizoliacija HDPE	M	34,5	+	+	+
7 Sandarinimo tarpinė iš pūsto PE	M	34,5	+	+	+
IŠORINĖS SIENOS		SIENOS, M2:	98,0	PERIMETR, M:	34,5
1 Medinis karkasas, 45x145mm, C24	M3	2,5	+	+	+
2 Išorinių sienų skydų montavimas	M2	98,0	+	+	+
ŠLAITINIS STOGAS		STOGAS, M2:	117,5	PAKALIM., M2:	35,00
1 Klijuotos medienos sijos ir kolonos	VNT	6,0	+	+	+
2 Gegnės, 45x195mm, ž=600mm	M3	2,2	+	+	+

PASTABOS:

- 1 Žemės darbų apimtys tikslinamos pagal faktines sąnaudas;
- 2 Automobilinio krano darbas neįskaičiuotas;
- 3 Konstrukcijų ir medžiagų transportavimas neįskaičiuotas;
- 4 Kaina koreguojama parengus techninį darbo projektą;
- 6 Technikos darbas (eskavatorius, gręžimo mašina, savivartis, betono siurblys ir kt.) neįskaičiuotas.
- 7 Pasiūlyme kaina paskaičiuota vykdant darbus pagal verslo liudijimą (darbas be PVM, medžiagos su PVM)
- 8 Žymenų reikšmė: "+" į kainą įtraukta; "-" į kainą neįtraukta
- 9 Darbams suteikiamos garantijos

IŠ VISO KAINA, EUR: 8400,00

1KV.M. KAINA, EUR: 140,00
