


## KOMERCINIS PASIŪLYMAS NR. WH 80.5

### SKYDINIO KARKASINIO NAMO PUSGAMINĖ DĖŽUTĖ

#### OBJEKTAS

PAV.: GYVENAMASIS NAMAS, PUSGAMINĖ DĖŽUTĖ, 70 KV.M.

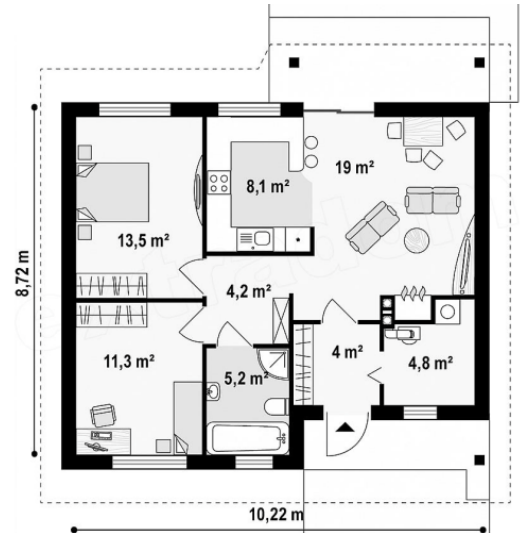

PAVADINIMAS	VNT.	KIEKIS	DARBAS	MEDŽIAG.	MECHAN.
<b>POLINIAI PAMATAI</b>		UŽSTAT., M2:	95	PERIMETR.,M:	40,3
1 Ploto planiravimas nuimant juodžemį	M2	133,0	+	+	+
2 Ašių nužymėjimas	M2	95,0	+	+	+
3 Gręžtiniai gelžbetoniniai poliai, D300	M3	3,1	+	+	+
4 Sutankintas pagrindas iš smėlio	M3	10,08	+	+	+
5 Apšiltintas GB rostverkas iš ICF H500	M2	20,15	+	+	+
6 Murloto hidroizoliacija HDPE	M	40,30	+	+	+
7 Sandarinimo tarpinė iš pūsto PE	M	40,30	+	+	+
<b>IŠORINĖS SIENOS</b>		SIENOS, M2:	135,9	PERIMET, M:	40,3
1 Medinis karkasas, 45x195mm, C24	M3	4,6	+	+	+
2 Išorinių sienų skydų montavimas	M2	135,9	+	+	+
<b>STOGO KONSTRUKCIJOS</b>		STOGAS, M2:	150	KIEKIS, VNT:	8
1 Medinės santvaros, ž=1200mm	VNT	8,00	+	+	+
2 Medinių santvarų montavimas	M2	150,00	+	+	+
3 Klijuotos medienos sijos ir kolonos	VNT	5,0	+	+	+

#### PASTABOS:

- Žemės darbų apimtys tikslinamos pagal faktines sąnaudas;
- Automobilinio krano darbas neįskaičiuotas;
- Konstrukcijų ir medžiagų transportavimas neįskaičiuotas;
- Kaina koreguojama parengus techninį darbo projektą;
- Technikos darbas (eskavatorius, gręžimo mašina, savivartis, betono siurblys ir kt.) neįskaičiuotas.
- Pasiūlyme kaina paskaičiuota vykdant darbus pagal verslo liudijimą (darbas be PVM, medžiagos su PVM)
- Žymenų reikšmė: "+" į kainą įtraukta; "-" į kainą neįtraukta
- Darbams suteikiamos garantijos

IŠ VISO KAINA, EUR: 10970,00

1KV.M. KAINA, EUR: 160,00
