


KOMERCINIS PASIŪLYMAS Nr. WH 50.1

SKYDINIO KARKASINIO NAMO PUSGAMINĖ DĖŽUTĖ

OBJEKTAS

PAV.: Vieno aukšto vienbutis gyvenamasis namas 50kv.m., B klasė.

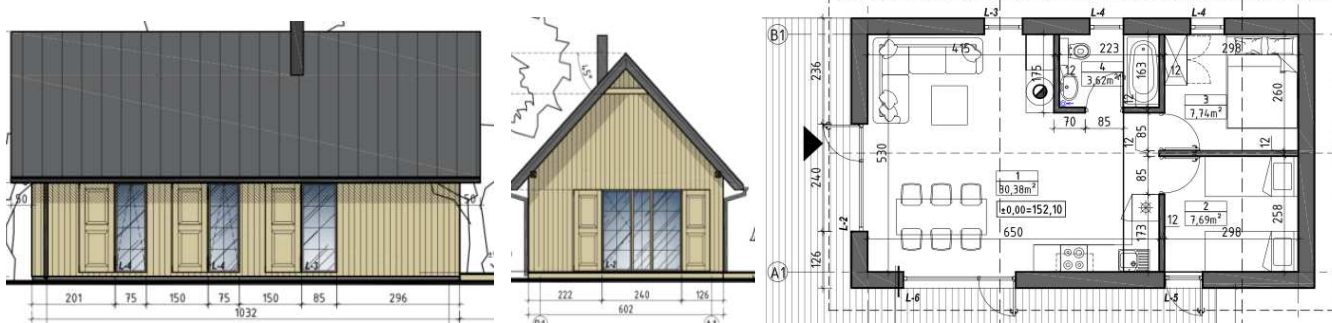

PAVADINIMAS	VNT.	KIEKIS	DARBAS	MEDŽIAG.	MECHAN.	SUMA
POLINIAI PAMATAI		UŽSTAT., M2:	61,8	PERIMETR., M:	32,6	
1 Ploto planiravimas nuimant juodžemį	M2	80,3	+	+	+	
2 Ašių nužymėjimas	M2	61,8	+	+	+	
3 Gręžtiniai gelžbetoniniai poliai, D300	M3	2,6	+	+	+	
4 Sutankintas pagrindas iš smėlio	M3	12,4	+	+	+	
5 Apšiltintas GB rostverkas iš ICF H400	M2	13,0	+	+	+	
6 Murloto hidroizoliacija HDPE	M	32,6	+	+	+	
7 Sandarinimo tarpinė iš pūsto PE	M	32,6	+	+	+	
IŠORINĖS SIENOS		SIENOS, M2:	95,3	PERIMET, M:	32,6	
1 Medinis karkasas, 45x145mm, C24	M3	2,4	+	+	+	
2 Išorinių sienų skydų montavimas	M2	95,3	+	+	+	
ŠLAITINIS STOGAS		STOGAS, M2:	105,00	PAKALIM., M2:	25,00	
1 Stogo santvaros, ž=1200mm	VNT	9,00	+	+	+	
2 Santvarų montavimas	M2	105,0	+	+	+	

PASTABOS:

- 1 Žemės darbų apimtys tikslinamos pagal faktines sąnaudas;
- 2 Automobilinio krano darbas neįskaičiuotas;
- 3 Konstrukcijų ir medžiagų transportavimas neįskaičiuotas;
- 4 Kaina koreguojama parengus techninį darbo projektą;
- 6 Technikos darbas (eskavatorius, gręžimo mašina, savivartis, betono siurblys ir kt.) neįskaičiuotas.
- 7 Pasiūlyme kaina paskaičiuota vykdant darbus pagal verslo liudijimą (darbas be PVM, medžiagos su PVM)
- 8 Žymenų reikšmė: "+" į kainą įtraukta; "-" į kainą neįtraukta
- 9 Darbams suteikiamos garantijos

IŠ VISO KAINA, EUR: 6980,0
1KV.M. KAINA, EUR: 140,00
