


## KOMERCINIS PASIŪLYMAS NR. WH50.2

### SKYDINĖS KARKASINĖS DIRBTUVĖS SU GARAŽU

#### OBJEKTAS

PAV.: Dirbtuvės su garažu ir san.mazgu, 50kv.m., su daline vidaus apdaila

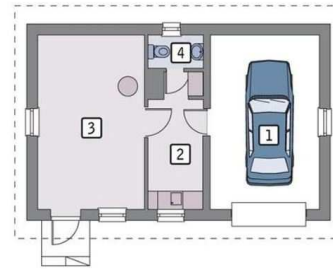

PAVADINIMAS	VNT.	KIEKIS	DARBAS	MEDŽIAG.	MECHAN.	SUMA
<b>POLINIAI PAMATAI</b>		UŽSTAT., M2:	55	PERIMETR.,M:	30	
1 Ploto planiravimas nuimant juodžemį	M2	66,0	+	+	+	
2 Ašių nužymėjimas	M2	55,0	+	+	+	
3 Gręžtiniai gelžbetoniniai poliai, D300	M3	2,4	+	+	+	
4 Sutankintas pagrindas iš smėlio	M3	7,2	+	+	+	
5 Apšiltintas GB rostverkas iš ICF H500	M2	15,0	+	+	+	
6 Murloto hidroizoliacija HDPE	M	30,0	+	+	+	
7 Sandarinimo tarpinė iš pūsto PE	M	30,0	+	+	+	
<b>GRINDYS ANT GRUNTO</b>		PLOTAS, M2:	49,0	PERIMETR.,M:	29,0	
1 Smėlio pagrindas grindims, 300mm	M3	14,7	+	+	+	
2 Šilumos izoliacija, EPS80, 50mm	M2	49,0	+	+	+	
3 Hidroizoliacija, PE plėvelė, 0,2mm	M2	49,0	+	+	+	
4 Armavimas tinklu 4/4/150/150mm	M2	49,0	+	+	+	
5 Grindų kompensacinė tarpinė	M	29,0	+	+	+	
6 Fibrobetoninės grindys, 65mm	M2	49,0	+	+	+	
<b>IŠORINĖS SIENOS</b>		SIENOS, M2:	75,0	PERIMETR, M:	30	
1 Vėjo barjero plokštė, GKP GTS9, 9mm	M2	69,0	+	+	+	
2 Medinis karkasas, 45x95mm, C24	M3	1,3	+	+	+	
3 Šilumos izol. karkase, min.vata, 100mm	M2	69,0	+	+	+	
4 Garų izoliacija, PE plėvelė, 0.2mm	M2	75,0	+	+	+	
5 Skersinis karkasas, 45x45mm, ž=600mm	M	127,5	+	+	+	
6 Šilumos izoliacija, min.vata, 50mm	M2	69,0	+	+	+	
7 GKP plokštė, 12mm	M2	75,0	+	+	+	
8 Išorinių sienų skydų montavimas	M2	75,0	+	+	+	
<b>LANGAI, DURYS, VARTAI</b>		ANGOS, M2:	10,65			
1 PVC langai ir durys, Rehau Euro70	M2	4,35	+	+	+	
2 Garažo vartai be el.pavaros, 2,5x2,5m	M2	6,25	+	+	+	
3 Angų izoliavimas montavimo putomis	M	22,00	+	+	+	
4 Sandarinimas vid. ir išor.	M	44,00	+	+	+	

VIDINĖS PERTVAROS	SIENOS, M2:	21,3	PERIMET, M:	8,5
-------------------	-------------	------	-------------	-----

Dvisluoksnių gipso kartono pertvarų

1 su metaliniu karkasu ir 100mm garso izoliacija įrengimas	M2	21,3	+	+	+
--	----	------	---	---	---

SIENŲ IŠORĖS APDAILA DAILYLENTĖMIS	SIENOS, M2:	85	ANGOS, M':	22
------------------------------------	-------------	----	------------	----

1 Vertikalus karkasas, 28x45mm	M	161,5	+	+	+
2 Horizontals karkasas, 28x45mm	M	161,5	+	+	+
3 Dažytos medinės dailylentės, 20mm	M2	85,0	+	+	+
4 Išorės palangės iš skardos	M	3,0	+	+	+
5 Dažytų langų ir durų apvadų įrengimas:	M	22,0	+	+	+

STOGO KONSTRUKCIJOS	STOGAS, M2:	60
---------------------	-------------	----

1 Medinės santvaros, cc=1200mm	VNT	60,00	+	+	+
2 Medinių santvarų montavimas	M2	60,00	+	+	+

ŠLAITINIO STOGO DANGA	STOGAS, M2:	70,00	PAKALIM., M2:	20,00
-----------------------	-------------	-------	---------------	-------

1 Antikondensacinė plėvelė	M2	70,00	+	+	+
2 Ventilacinis tašas, 45x45mm	M	73,50	+	+	+
3 Grebėstas, 32x100mm, cc=300mm	M	234,50	+	+	+
4 Plieninė stogo danga, Ruukki Classic	M2	70,00	+	+	+
5 Pakalimas dažyt.dailylentėmis, 20mm	M2	20,00	+	+	+
6 Laštakiai iš skardos	M	20,00	+	+	+
7 Kraigas iš skardos	M	10,00	+	+	+
8 Plieniniai latakai	M	20,00	+	+	+
9 Plieniniai lietvamzdžiai	M	6,00	+	+	+
10 Ventilaciniai kaminėliai	VNT	2,00	+	+	+
11 Dūmtraukis Schiedel PMSA A++	KOMP.	0,0	-	-	-

LUBŲ ĮRENGIMAS	LUBOS, M2:	55,00
----------------	------------	-------

1 Šilumos izoliacija, min.vata, 200mm	M3	11,00	+	+	+
2 Garo izoliacija, PE plėvelė, 0.2mm	M2	55,00	+	+	+
3 Medinis karkasas, cc600mm	M2	55,00	+	+	+
4 GKP plokštė, 12mm	M2	55,00	+	+	+

SANDARINIMAS
--------------

1 Sandarinimas juostomis	M	100,0	+	+	+
2 Sandarinimas mastika	M	50,0	+	+	+

**PASTABOS:**

- Žemės darbų apimtys skaičiuojamos pagal faktines sąnaudas;
- Automobilinio krano darbas neįskaičiuotas;
- Konstruktijų ir medžiagų transportavimas neįskaičiuotas;
- Kaina koreguojama parengus techninį darbo projektą;
- Technikos darbas (eskavatorius, gręžimo mašina, savivartis, betono siurblys ir kt.) neįskaičiuotas.
- Pasiūlyme kaina paskaičiuota vykdant darbus pagal verslo liudijimą (darbas be PVM, medžiagos su PVM)
- Žymenų reikšmė: "+" į kainą įtraukta; "-" į kainą neįtraukta
- Darbams suteikiamos visos garantijos

**IŠ VISO KAINA, EUR: 21630,00**  
**1KV.M. KAINA, EUR: 430,00**
